



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

SAM 8.1.3.

«Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu»

Valsts izglītības attīstības aģentūras
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta direktors
Ilvars Bergmanis
ilvars.bergmanis@viaa.gov.lv



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

VIAA loma ERAF infrastruktūras projektos 2007.-2013. un 2014.-2020.g.

2007.-2013. (3.1.1.1.akt.)

- Atbalsta funkcijas PII:
 - iepirkumu dokumentācijas izstrādāšana;
 - jebkuru dokumentu pārbaude pirms to parakstīšanas;
 - veikto būvdarbu un piegāžu pārbaude pirms maksājumu veikšanas.


2014.-2020. SAM 8.1.3.

- Sadarbības partneris IZM padotības PII:
 - projektu izstrādāšana;
 - projektu vadība un īstenošana;
 - iepirkumu norises nodrošināšana;
 - līgumu izpildes uzraudzība;
 - atskaišu u.c. dokumentācijas sagatavošana iesniegšanai CFLA.



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

SAM 8.1.3. IZM padotības PII kartējums

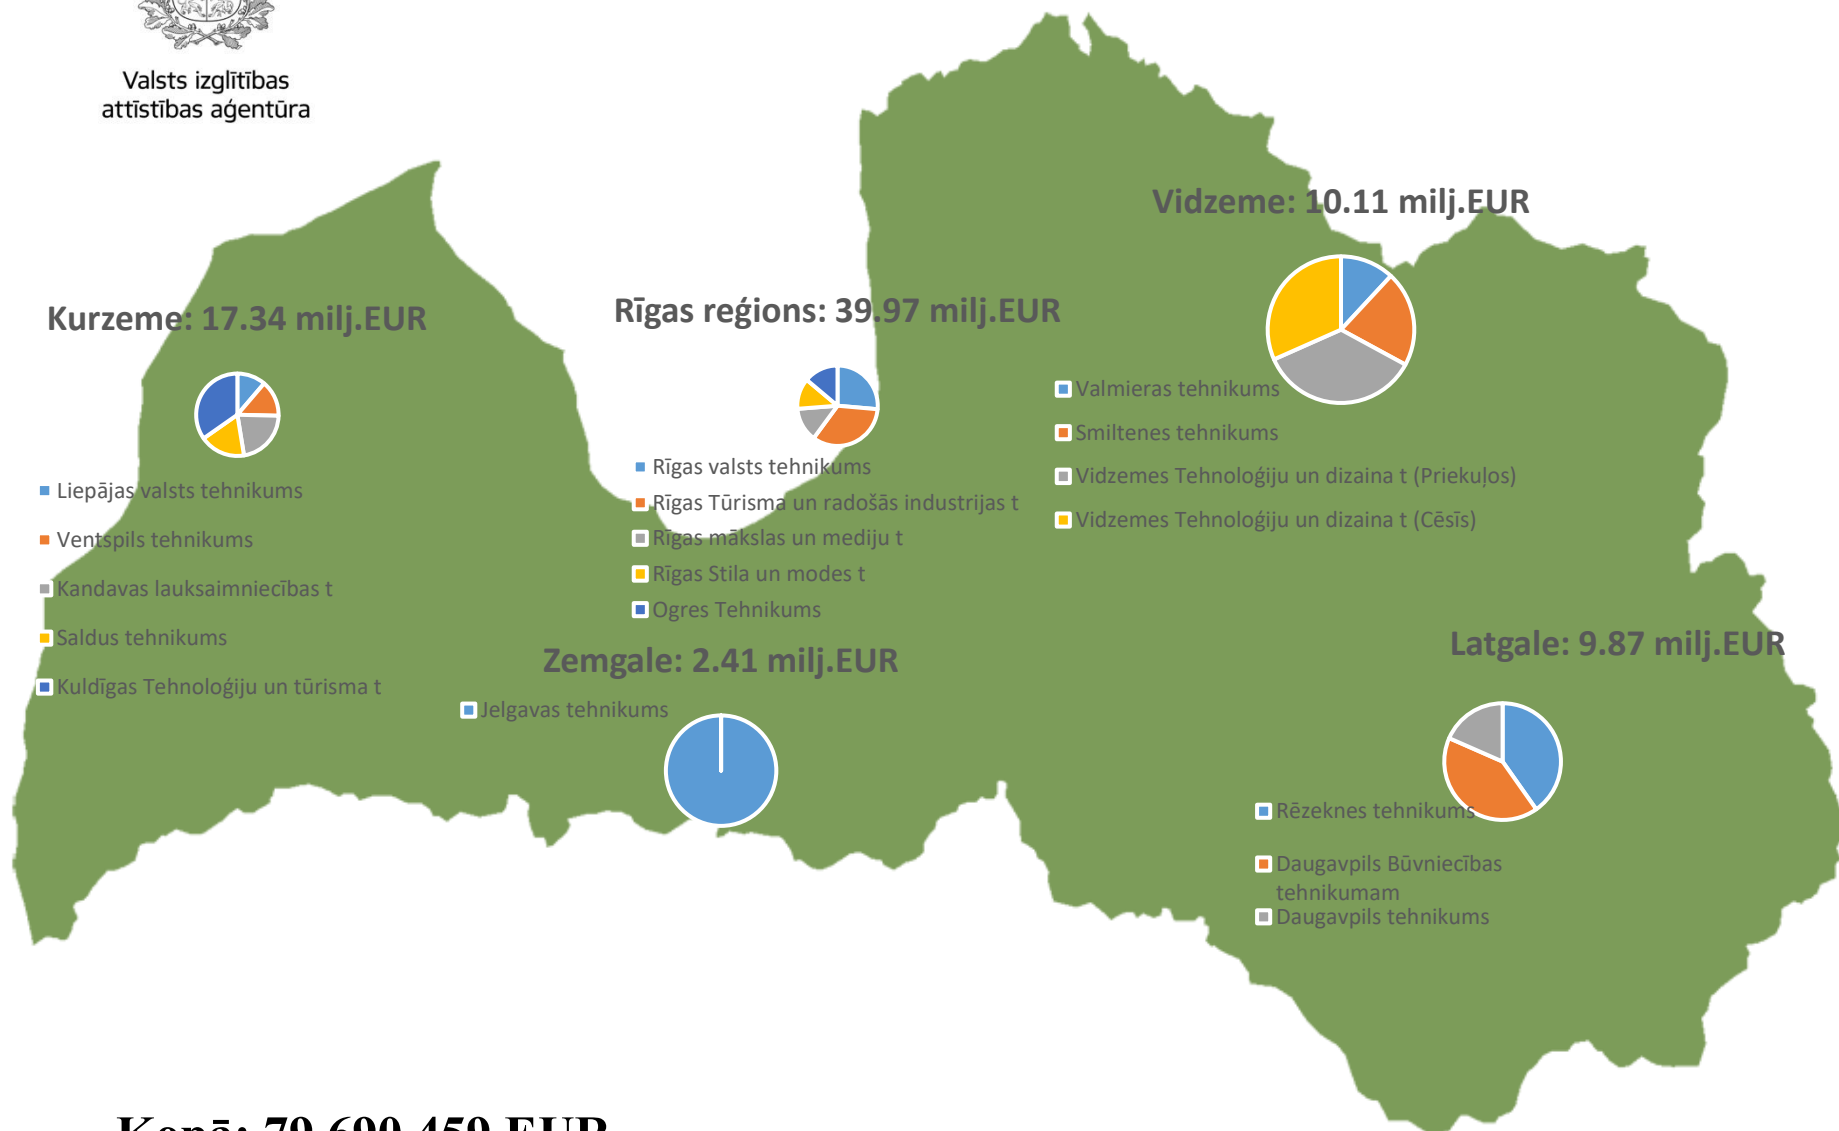



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

SAM 8.1.3. IZM padotības PII projektu īstenošanas termiņi

	2019		2020.gads												2021.gads												2022.gads												2023.gads											
	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ventspils tehnikums																																																		
Valmieras tehnikums																																																		
Kandavas lauksaimniecības tehnikums																																																		
Smiltenes tehnikums																																																		
Ogres tehnikums																																																		
Latgales industriālais tehnikums																																																		
Daugavpils tehnikums																																																		
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums (Cēsis)																																																		
Jelgavas tehnikums																																																		
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums																																																		
Saldus tehnikums																																																		
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums (Priekule)																																																		
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums																																																		
Rīgas Valsts tehnikums																																																		
Rēzeknes tehnikums																																																		
Liepājas Valsts tehnikums																																																		
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums																																																		
Rīgas Stila un modes tehnikums																																																		

projektu īstenošana ir
noslēgusies

turpinās projektu
īstenošana



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

SAM 8.1.3. IZM padotības PII projektu īstenošanas termiņu pagarinājuma iemesli

1. būvprojekta izstrādes līguma nekvalitatīva pildīšana, kas izpaužas kā būvprojekta izstrādes termiņa būtisks kavējums. Šo kavējumu neietekmē apstākļi, ka pasūtītājs piemēro līgumsodu par kavējumu. Maksimāli pieļaujamais līgumsoda apmērs ir 10% no līgumcenas, ar ko bieži vien izpildītāji rēķinās iesniedzot finanšu piedāvājumus un pēc šī maksimālā līgumsoda apmēra sasniegšanas pasūtītājam vairāk nav būtisku instrumentu, kā piespiest izpildītājus ievērot līgumā noteiktos termiņus. Šis pats apstākļi arī ietekmē piegāžu līgumus;
2. izstrādātā būvprojekta sliktā kvalitāte. Sliktā kvalitātē izstrādāts būvprojekts var neplānoti pagarināt būvdarbu iepirkuma procedūru pat līdz 6 mēnešiem, jo ir daudz neatbilstību starp tāmēm un būvprojektu. Attiecīgi iepirkuma procedūras izsludināšanas laikā tiek saņemti ļoti daudzi jautājumi no ieinteresētajiem būvniekiem un jāveic daudzi un apjomīgi precizējumi būvdarbu iepirkuma dokumentācijā. Turklāt šiem precizējumiem ir nepieciešama būvprojekta autora iesaiste, kas ne vienmēr ir operatīva un kvalitatīva. Tāpat būvprojekta kvalitāte, var ietekmēt būvdarbu līgumu, jo ne vienmēr iepirkuma laikā tiek atklāti visi trūkumi būvprojektā, kas attiecīgi vēl rada būvdarbu izpildes pagarinājumu. Turklāt šādas kļūdas tiek konstatētas būvprojektos, kuriem ir veikta būvekspertīze un sniegts pozitīvs atzinums;



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

SAM 8.1.3. IZM padotības PII projektu īstenošanas termiņu pagarinājuma iemesli

3. uzvarētājs būvdarbu līgumā atsakās slēgt līgumu. Uzvarējušais pretendents konstatē, ka piedāvātā cena iepirkumā ir aprēķināta ļoti zema un pildot līgumu par šo cenu, ir ļoti maza peļņas iespēja. Attiecīgi ir jāslēdz līgums ar nākamo saimnieciski izdevīgāko pretendentu, kur nepieciešams laiks atkal informēšanai par rezultātu iepirkumā un arī iespējama finansējuma piesaiste/pārdale projektā, jo nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums būs dārgāks;
4. laikapstākļi un gadalaiks būvdarbu iepirkumos. Iepriekš minētie aspekti attiecībā uz būvprojekta izstrādi un būvdarbu iepirkumu ietekmē būvdarbu līguma noslēgšanas termiņu un attiecīgi arī pašu būvdarbu uzsākšanu. Neliela nobīde plānotajā grafikā var būtiski ietekmēt būvdarbu termiņu, piemēram, rakšanas un betonēšanas darbi iekrīt ziemā, nevis vasarā, kā plānots, kas tehnoloģiski un finansiāli apgrūtina un paildzina šo darbu izpildi, kas savukārt atstāj ietekmi uz būvdarbu kopējo termiņu;
5. nepietiekams finansējums/pārāk dārgi piedāvājumi būvdarbu iepirkumos. Būvdarbu iepirkumā visi saņemtie piedāvājumi ievērojami pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu projektā, kā arī nav iespējams pārdalīt finansējuma no citām projekta aktivitātēm, attiecīgi nav iespējams noslēgt līgumu. Arī atkārtota iepirkuma procedūras izsludināšana, būvprojekta maksimāla novienkāršošana (paredzot arī izslēdzamo darbu apjomus) tik un tā nerada būtisku piedāvāto cenu samazinājumu;



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

SAM 8.1.3. IZM padotības PII projektu īstenošanas termiņu pagarinājuma iemesli

6. iesniegumi par iepirkuma procedūrām Iepirkumu uzraudzības birojam. Ir gadījumi, kad vienas iepirkuma procedūras ietvaros tiek saņemti vairāki iesniegumu un arī gadījumā, ja tie ir nepamatoti, būtiski pagarinās līguma noslēgšanas termiņš, ņemot vērā nepieciešamo laiku atkārtotai lēmuma pieņemšanai, pretendentu informēšanai, iesnieguma saņemšanai, izskatīšanai un iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma saņemšanai;
7. iepirkuma procedūrās netiek saņemti piedāvājumi. Būtisku ietekmi uz saņemto piedāvājumu skaitu ir radījis pienākums iepirkumus veikt Elektronisko iepirkumu sistēmā. Ne visi piegādātāji ir reģistrējušies sistēmā, savukārt pretendenti, kas iesniedz piedāvājums, mēdz pieļaut tehniskas neprecizitātes, iesniedzot piedāvājuma dokumentus un līdz ar to piedāvājumu ir noraidāmi. Tāpat iespējams iemesls ir stingrie līguma nosacījumi attiecībā pret izpildītājiem, kuros ir paredzētas pasūtītāja vienpusējās atkāpšanās tiesības, kas ir obligāti jāparedz līgumos saskaņā ar 20.09.2016. Ministru kabineta instrukciju Nr.3 “Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs”. Atsevišķiem iepirkuma priekšmetiem iemesls mazajai piegādātāju interesei ir salīdzinoši nelielais apjoms;
8. mācību aprīkojumu piegādātājs kavē līguma izpildes termiņus vai piegādātā prece neatbilst iesniegtajam piedāvājumam un tehniskajai specifikācijai
9. pastāv iespēja, ka kopš 2022.gada februāra Krievijas uzsāktā pret Ukrainu kara un piemēroto sankciju dēļ, var tikt pagarināti projektu īstenošanas termiņi dēļ:
 - 9.1. materiālu (tērauds, metāls) trūkuma vai neesamības būvniekam,
 - 9.2. būvmateriālu ražošanas izmaksu palielinājuma, kas saistītas ar energoizmaksas cenu pieaugumu, gan karu;
 - 9.3. jaunu risinājumu meklēšana, pārstrādājot būvprojektu, līdz ar to jaunas būvprojekta ekspertīzes nepieciešamība, tā saskaņošana visas instancēs, kas paildzina būvdarbu izpildi;
 - 9.4. būvstrādnieku darba samaksas pieaugums.



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Pašreizējais progress uz 31.01.2023. IZM padotības PII

- 30.11.2019. noslēgusies Ventspils tehnikuma, 28.02.2020. Valmieras tehnikuma, 31.07.2020. Kandavas lauksaimniecības tehnikuma, 30.09.2020. Ogres tehnikuma un Smiltenes tehnikuma, 30.11.2020. Daugavpils Būvniecības tehnikuma, 31.12.2020. Daugavpils tehnikuma, 28.02.2021 Saldus tehnikuma, 30.10.2021. Jelgavas tehnikuma un Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (Cēsīs), 30.04.2022. Rīgas Valsts tehnikuma, 31.10.2022. Rēzeknes tehnikuma, 30.22.2022. Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (Priekuļos), 31.12.2022. Liepājas Valsts tehnikuma projektu īstenošana.
- Tiek turpināta 4 apstiprināto projektu īstenošana.
- Notiek būvniecība 2 objektos 2 projektos – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra pārbūve (Kalpaka ielā 1) un Rīgas Stila un modes tehnikuma Dienesta viesnīcas pārbūve.
- Uz šo brīdi kopā pabeigti 38 būvobjekti:
 - 1. 2018.gada pabeigti 4 objekti:**
 - 1.1 Ogres tehnikums – Meža tehnikas mācību poligons Rankas struktūrvienībā;



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Pašreizējais progress uz 31.01.2023. IZM padotības PII

- 1.2 Ogres tehnikums – Dabas zinātņu un mežsaimniecības kabinetu vienkāršotā atjaunošana Rankas struktūrvienībā;
- 1.3 Ogres tehnikums – Dienesta viesnīcas pārbūve;
- 1.4 Ventpils tehnikums – Elektromontāžas darbi Metināšanas darbnīcā.

2. 2019. gadā pabeigti 10 objekti:

- 2.1 Rēzeknes tehnikums - Multifunkcionālas zāles jaunbūve;
- 2.2 Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (Priekuļi) - Sporta zāles grīdas atjaunošana;
- 2.3 Rīgas Valsts tehnikums - Dienesta viesnīcas jaunbūve;
- 2.4 Rīgas Valsts tehnikuma – Metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbi
- 2.5 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums - Dienesta viesnīcas pārbūve Preiļos;
- 2.6 Liepājas Valsts tehnikums - Stadiona laukuma pārbūve;
- 2.7 Valmieras tehnikums - Multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorijas jaunbūve;
- 2.8 Smiltenes tehnikums - Alsviķu struktūrvienības - Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo inženiertīklu atjaunošana;



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Pašreizējais progress uz 31.01.2023. IZM padotības PII

2.9 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – 2 objekti - Ēku Liepājas ielā 31, 33 vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā fasādes atjaunošana.

3. 2020. gadā pabeigti 10 objekti:

3.1.Kandavas Lauksaimniecības tehnikums – Stadiona un administrācijas ēkas pārbūve;

3.2.Kandavas Lauksaimniecības tehnikums – Dienesta viesnīcas atjaunošana;

3.3.Smiltenes tehnikums - Mācību manēžas izveide;

3.4.Smiltenes tehnikums – Dienesta viesnīcas pārbūve;

3.5.Ogres tehnikums - Multifunkcionālas zāles jaunbūve;

3.6.Daugavpils Būvniecības tehnikums - Slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcu jaunbūve;

3.7.Jelgavas tehnikums – Sporta zāles jaunbūve;

3.8.Saldus tehnikuma - Sporta zāles vienkāršotā atjaunošana;



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Pašreizējais progress uz 31.01.2023. IZM padotības PII

3.9.Daugavpils Tehnikums - Baseina pārbūve par laboratorijas korpusu;

3.10. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (Cēsis) – Dienesta viesnīcas jaunbūve.

4. 2021. gadā pabeigti 10 objekti:

4.1.Saldus tehnikuma - Zēnu un Meiteņu Dienesta viesnīcu pārbūves darbi (2 objekti);

4.2.Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums - Lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūve;

4.3.Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (2 objekti) Daudzfunkcionālā mācību korpusa jaunbūve un Dienesta viesnīcas pārbūves darbi 1. un 2. kārtā;

4.4.Rīgas Valsts tehnikuma (2 objekti) Multifunkcionālā korpusa jaunbūve un āra sporta laukumu labiekārtošanas darbi un Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaitēju vienkāršotā atjaunošana Kronvalda bulvārī 1A;

4.5.Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (3 objekti) Mācību korpusa pārbūve, Mācību darbnīcas pārbūve un Sporta zāles jaunbūve un sporta laukuma pārbūve.



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Pašreizējais progress uz 31.01.2023. IZM padotības PII

5. 2022. gadā pabeigti 4 objekti;

- Rīgas Valsts tehnikuma Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaitēju vienkāršotā atjaunošana Nolikta ielā 2;
 - Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve Pilsētas laukumā 6;
 - Rēzeknes tehnikuma Mācību darbnīcas pārbūve;
 - Liepājas Valsts tehnikuma Mācību korpusa 3. un 4.stāva pārbūve.
-
- Uzsāktas un turpinās izglītības programmu modernizācija 6 izglītības programmās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā.
 - Uz 2023. gada janvāra beigām pilnībā aprīkotas 60 izglītības programmas 16 tehnikumos.
 - Uz 2023. gada janvāra beigām iesniegti MP par kopējo summu EUR 71 431 299,20, kas sastāda 89,69% no kopējās apgūstamās attiecināmās summas EUR 79 638 041,61.



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Modernizētās izglītības programmas / kvalifikācijas IZM padotības PII

Finansējuma saņēmējs	Izglītības programma / Kvalifikācija, ja norādīta PI 1.5.sadaļā.	Gads (<u>ceturksnis</u>), kad notikusi modernizācija	Summa, EUR
DT	Dzelzceļa pakalpojumi	2020 (3)	233 212,00
LVT	Šuto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija	2022 (3)	24 872,76
RVT	Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana (kvalifikācijas: Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis, Kokapstrādes iekārtu operators un Programm vadības kokapstrādes darbgaldu/līniju operators);	2018 (4)	270 738,14
	Kokizstrādājumu izgatavošana (kvalifikācijas: Mēbeļu galdnieks un Galdnieks)	2018 (4)	
	"Dzelzceļa pakalpojumi" (kvalifikācijas: Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis un Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju tehniķis);	2019 (4)	1 021 240,00
	Enerģētika un elektrotehnika (kvalifikācija: Atjaunīgās enerģijas tehniķis)	2017 (4)	289 999,49
	Autotransports (kvalifikācijas: Automehāniķis un Transportlīdzekļa krāsotājs)	2021 (3)	195 887,38
	Ķīmijas tehnoloģija (iegūstamā kvalifikācija: Materiālu ķīmijas tehniķis)	2019 (2)	193 255,15
	Programmēšana (iegūstamā kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis)	2018 (4)	149 100,64
	Datorsistēmas (iegūstamā kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis)	2018 (4)	



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Modernizētās izglītības programmas / kvalifikācijas IZM padotības PII

RTRIT	Miltu izstrādājumu ražošana (Preiļos)	2019 (4)	60 802,50
	Viesnīcu pakalpojumi (Preiļos)	2019 (4)	26 426,40
	Tūrisma un atpūtas organizācija	2021 (3)	7 801,39
	Lauku tūrisma pakalpojumi	2021 (3)	
	Tūrisma pakalpojumi	2021 (3)	
	Gaļas produktu ražošana	2022 (2)	
	Pārtikas produktu kvalitātes kontrole	2022 (2)	
VaT	Programmēšana	2020 (1)	109 074,39
	Mehānika un metālapstrāde	2020 (1)	168 930,00
VTDT(Cēsis)	Telekomunikāciju tehniķis, Programmēšana, Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli	2020 (1)	71 292,00
VTDT (Priekule)	Autotransports	2018 (4)	311 509,66
	Lauksaimniecības tehnika	2022 (4)	333 359,53
	Augkopība	2022 (4)	
	Lauksaimniecība	2022 (4)	
SmT	Hidrobūvju tehniķis	2022 (4)	541 664,54
	Lopkopības tehniķis	2020 (1)	183 938,15
LIT	IP "Energētika" "Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis"	2020 (3)	2 271,28
	IP "Autotransports" "Transportlīdzekļu krāsotājs"	2018 (4)	193 944,53
	IP "Metālapstrāde" "Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē"	2020 (4)	50371,4
	IP "Būvdarbi": Kvalifikācija "Ēkas būvtehniķis"	2020 (4)	132767,25
	IP "Būvdarbi": Kvalifikācija "Sausās būves tehniķis"	2020 (4)	
	IP "Būvniecība" : Kvalifikācija "Ģeotehniķis"	2020 (4)	
OT	IP "Mašīnzinības" - Ranka un Ogre	2020 (4)	41204,29
	IP "Koka izstrādājumu izgatavošana" - Ranka	2020 (4)	55630,73
	IP "Meža darbi un tehnika" - Ranka	2020 (3)	256 046,43
		2018 (3)	142 311,79



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Modernizētās izglītības programmas / kvalifikācijas IZM padotības PII

JT	Programmēšana	2021 (3)	324 732,76
	Datorsistēmas	2021 (3)	
	Autotransports	2020 (2)	113 478,64
SaT	Būvniecība, Kvalifikācija; hidrobūvju tehniķis	2017 (4)	75 508,67
KLT	IP "Lauksaimniecības tehnika"/kvalifikācija: spēkratu mehāniķis	2019 (2)	294 682,00
	IP "Autotransports"/ kvalifikācija: automehāniķis	2019 (3)	284 738,07
KTTT	IP "Viesnīcu pakalpojumi"	2020 (4)	50 501,04
	IP "Tūrisma pakalpojumi"	2020 (4)	
RMMT	"Vizuālās saziņas līdzekļu māksla" / "Video operators"	2018 (4)	21 055,57
	"Multimediju dizains" / "Multimediju dizaina speciālists"	2021 (3)	14 725,70
	"Foto dizains" / "Foto dizaina speciālists"	2018 (4)	18 030,21
	"Vides dizains" / "Vides dizaina speciālists" un "Tēlniecības objektu speciālists"	2018 (4)	20 083,69
	"Interjera dizains" / "Interjera dizaina speciālists"	2018 (4)	3 509,00
	"Reklāmas dizains" / "Vizuālās reklāmas dizaina speciālists"	2018 (4)	5 245,35
	"Tekstilizstrādājumu dizains" / "Tekstilmateriālu dizaina speciālists"	2019 (1)	17 726,50
	"Apģērbu dizains" / "Apģērpu dizaina speciālists"	2018 (4)	6 858,28
	"Metāla mākslinieciskās apstrāde" / "Metālmākslas izstrādājumu modelētājs"	2019 (1)	55 624,91
	"Koka mākslinieciskā apstrāde" / "Stila mēbeļu modelētājs"	2018 (4)	117 370,00
	"Būvniecība" / "Apdares darbu tehniķis"	2018 (4)	6 836,50



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Modernizētās izglītības programmas / kvalifikācijas IZM padotības PII

RT	"Kokizstrādājumu izgatavošana"	2022 (4)	80 126,20
	"Mehatronika"	2022 (4)	343 147,53
VeT	"Metālapstrāde" / "MMA", "MAG", "TIG"	2019 (4)	296 370,04
	"Mehatronika" / "Mehatronisko sistēmu tehniķis"	2019 (4)	745 091,96
	"Enerģētika un elektrotehnika" / "Elektrotehniķis"	2019 (4)	480 281,00
	"Datorsistēmas" / "Datorsistēmu tehniķis" un "Programmēšanas tehniķis"	2019 (4)	591 030,00
		Kopā, EUR:	9034405,44

Svarīgi ir atcerēties, ka Finansējuma saņēmējs nodrošina Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, ievērojot Regulas Nr.1303/2013 71.pantā un SAM 8.1.3. MK noteikumos noteiktos nosacījumus un termiņus Projekta darbības īstenošanas laikā un 5 gadu periodā, kas sākas pēc noslēguma maksājumu veikšanas, kā arī neizdarīt būtiskas izmaiņas Projektā, t.sk.:

- 1.Izmantot Projektā attīstīto infrastruktūru un sasniegtos rezultātus projektā plānotās darbības veikšanai un saskaņā ar Projekta paredzēto mērķi,
- 2.Nepārdot, nedāvināt, neizīrēt, neiznomāt, nemainīt, neaizdot, nepatapināt, neieķīlāt, citādi neatsavināt un neapgrūtināt īpašumu, kas iegādāts vai rādīts projektā, un īpašumu, kas guvis labumu no atbalsta, kā arī neveikt citas darbības, kuru rezultātā īpašums pilnīgi vai daļēji var nokļūt citas personas īpašumā vai valdījumā, izņemot gadījumus, kad saņemta Sadarbības iestādes (CFLA) iepriekšēja rakstiska atļauja un Finansējuma saņēmēja iecerētās darbības neizraisa nevēlamas sekas.



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Plānotais 2023.gadā

Divi būvniecības objekti:

- + Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – Tehnoloģiju centra pārbūve (Kalpaka ielā 1);
- + Rīgas Stila un modes tehnikums - Dienesta viesnīcas pārbūve.



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

2022.gadā pabeigtie objekti -

Rīgas Valsts tehnikuma Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu
un gaitenju vienkāršotā atjaunošana Nometņu ielā 2





Valsts izglītības
attīstības aģentūra

2022.gadā pabeigtie objekti -

Liepājas Valsts tehnikuma Mācību korpusa 3. un 4.stāva pārbūve





Valsts izglītības
attīstības aģentūra

2022.gadā pabeigtie objekti - Rēzeknes tehnikuma Mācību darbnīcas pārbūve





Valsts izglītības
attīstības aģentūra

2022.gadā pabeigtie objekti -

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve Pilsētas laukumā 6





Valsts izglītības
attīstības aģentūra

SAM 8.1.3. sasniedzamie Rezultāti

- Modernizētas kopumā 66 izglītības programmas
- Ar mūsdienīgu datortehniku apgādātas 8 profesionālās izglītības iestādes
- Pārbūvētas 10 dienesta viesnīcas
- Izbūvētas 9 sporta/multifunkcionālās halles
- Veikti 20 mācību ēku un darbnīcu būvdarbi



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Paldies par uzmanību!

